

CONSTRUCTION DU BARRAGE DE MÉJEAN ET AMÉNAGEMENTS DU CHEMIN DU GRAND BOIS

INFOS CHANTIER : Avril 2023

CONTACTS



Entreprises
Marion Sanguinetti
06 76 09 16 95




Maîtrise d'ouvrage
Fideline Sebileau
04 66 02 55 71



MARS 2023 : Travaux réalisés


Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :

- Déboisement et dégagement des emprises du barrages
- Aménagement de l'accès provisoire dans le cadereau du Camplanier
- Mesure environnementale : Stockage et mise en défens des clapas

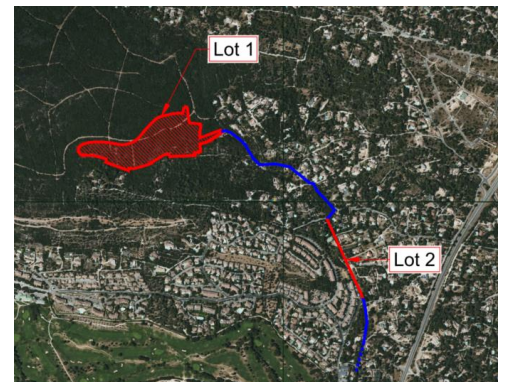

Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :

- Géo-détection / sondage manuel / marquage-piquetage des réseaux existants
- Sondage géotechnique à la pelle mécanique

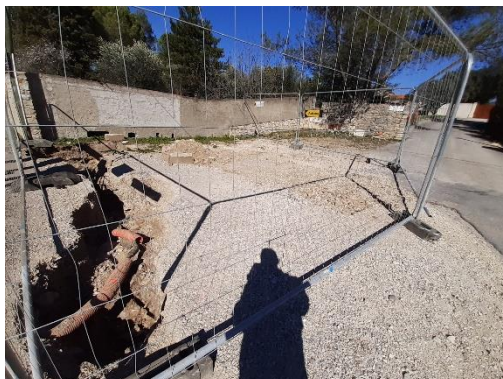


AVRIL 2023 : Travaux à venir

Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :


- Démarrage de la phase d'exécution des travaux
- Travaux de terrassement

Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :


- Travaux préparatoires du 11/04/2023 au 14/04/2023 :
 - Installation de la base vie
 - Travaux de branchement d'un réseau provisoire en eau potable sous route barrée (cf. plan 01 page suivante) (bleu sur plan)
 - Travaux de abattage / débroussaillage / défrichage dans l'emprise des travaux (vert sur plan)
 - Investigations géotechniques complémentaires (rose sur plan)
- Démarrage de la phase d'exécution des travaux à partir du 24/04/2023 :
 - Mise en place de la déviation de la circulation (cf. plan 02 page suivante)
 - Phase 01 : Dégagement des emprises côté fossé / cadereau pluvial

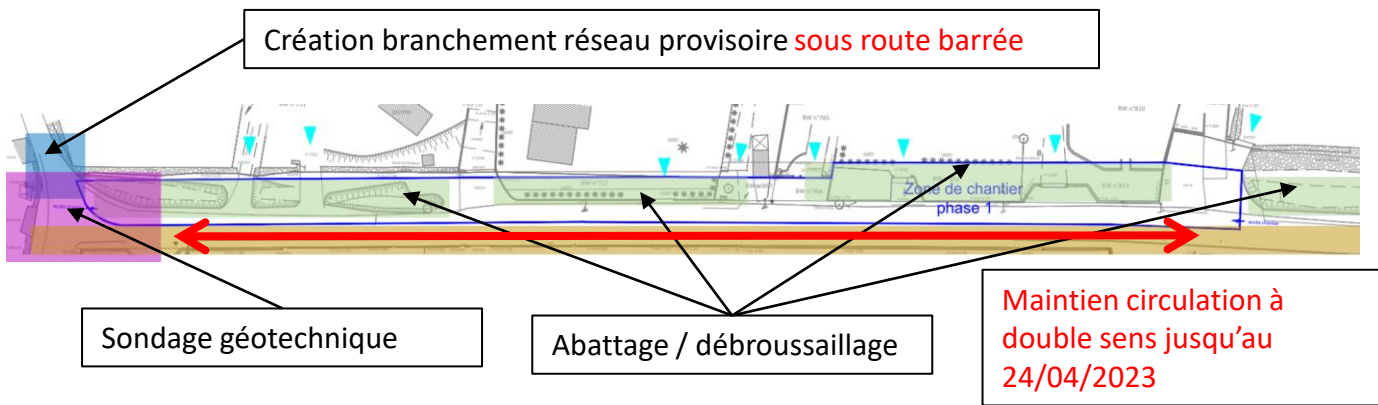

COUPE TYPE – Travaux aménagement ch. du grand Bois

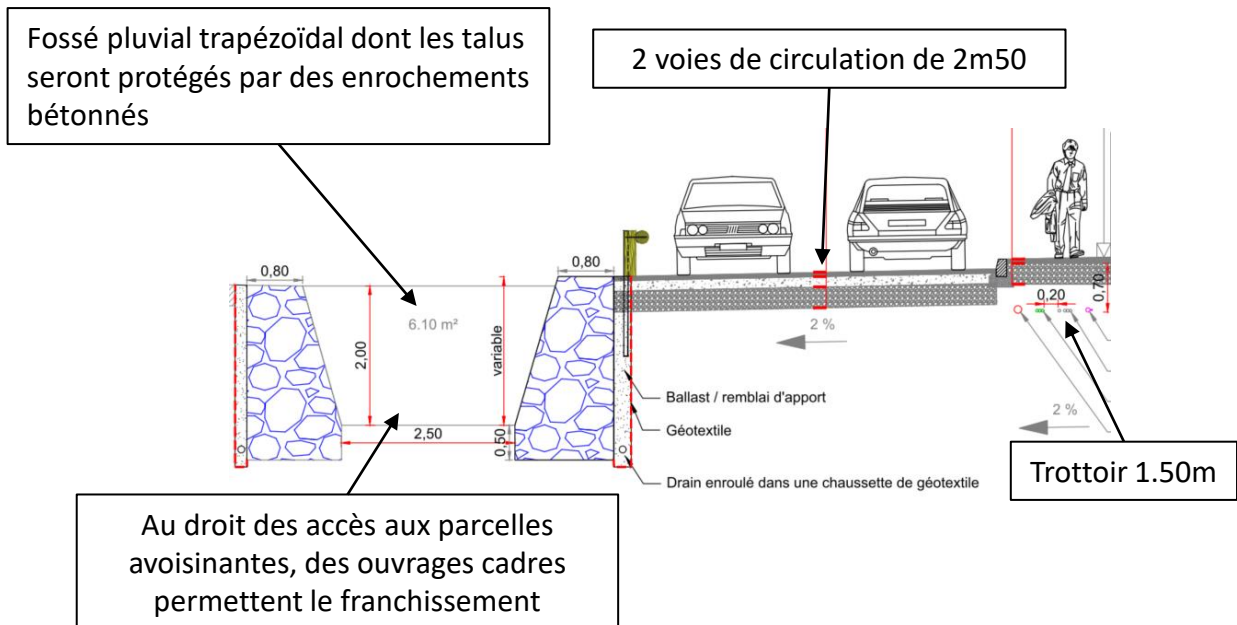

Plan gestion provisoire de la circulation du 11/04/2023 au 14/04/2023

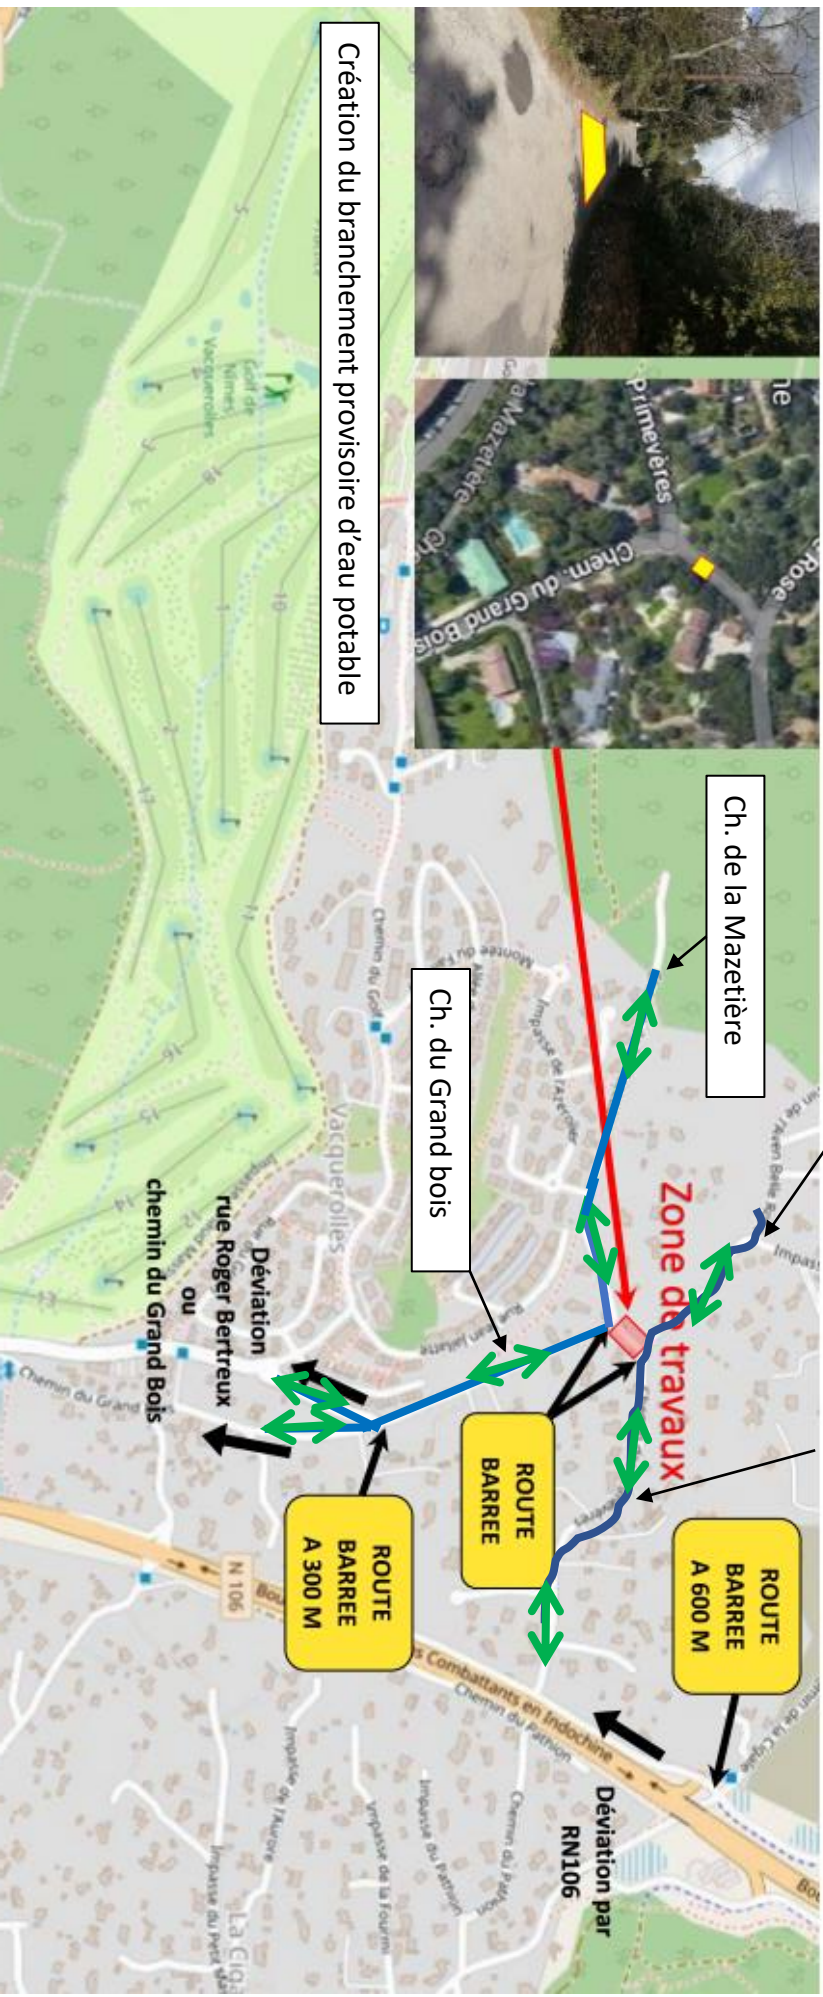

Ch. de l'aven de la Belle Rose

Ch. des Primevères

Ch. de la Mazetière

Ch. du Grand bois

Création du branchement provisoire d'eau potable



Maintien du double sens de circulation

Plan gestion provisoire de la circulation du 24/04/2023 au 01/12/2023

