

CONSTRUCTION DU BARRAGE DE MÉJEAN ET AMÉNAGEMENTS DU CHEMIN DU GRAND BOIS

INFOS CHANTIER : NOVEMBRE 2023

CONTACTS



Entreprises
Marion Sanguinetti
06 76 09 16 95



Maîtrise d'ouvrage
Fideline Sebileau
04 66 02 55 71



SEPTEMBRE / OCTOBRE 2023 : Travaux réalisés

Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :

- Terrassement de l'emprise du barrage réalisée ;
- Mise en œuvre / montage / compactage du noyau argileux du barrage en cours (90% d'exécution) ;
- Pose d'un géotextile de séparation sur la face amont du noyau argileux en cours (90% d'exécution) ;
- Mise en œuvre / montage / compactage du remblai amont du barrage en cours (90% d'exécution) ;



Remblai amont du barrage

Noyau argileux



Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :

- Terrassement et mise en œuvre des enrochements bétonnés dans les fossés à ciel ouvert en cours (95% d'exécution) ;
- Terrassement en pose des caniveau U sur le tronçon amont du cadereau en cours (60% d'exécution) ;
- Terrassement et pose des cadres préfabriqués sous les entrées charretières réalisés ;
- Aménagement des limites parcellaires des riverains concernés en cours ;
- Pose des branchements d'eau potable et télécoms en cours (90% d'exécution) ;
- Réception des réseaux / équipements pour ENEDIS réalisée ;


**NOVEMBRE 2023 : Travaux à venir****Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :**

- Mise en œuvre / montage / compactage du remblai amont et du noyau argileux du barrage ;
- Pose d'une géomembrane sur la face aval du noyau argileux et complexe drainant ;
- Mise en œuvre / montage / compactage du remblai aval du barrage ;

Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :

- Maintien de la déviation de la circulation provisoire selon la phase 03 des travaux (**Le sens unique de circulation provisoire reste inchangé**) ;
- Terrassement en pose des caniveau U sur le tronçon amont du cadereau ;
- Enfouissement et basculement du réseau définitif de ENEDIS ;
- Réception / enfouissement et basculement du réseau définitif de ORANGE ;
- Réception et mise en service des nouveaux branchements d'eau potable ;
- Aménagement des accès et clôtures des riverains concernés ;
- Pose des bordures du futur trottoir côté ouest.

**PHASE 03 DES TRAVAUX : Plan d'aménagement provisoire de la circulation au droit des travaux du
25/09/2023 au 24/11/2023**

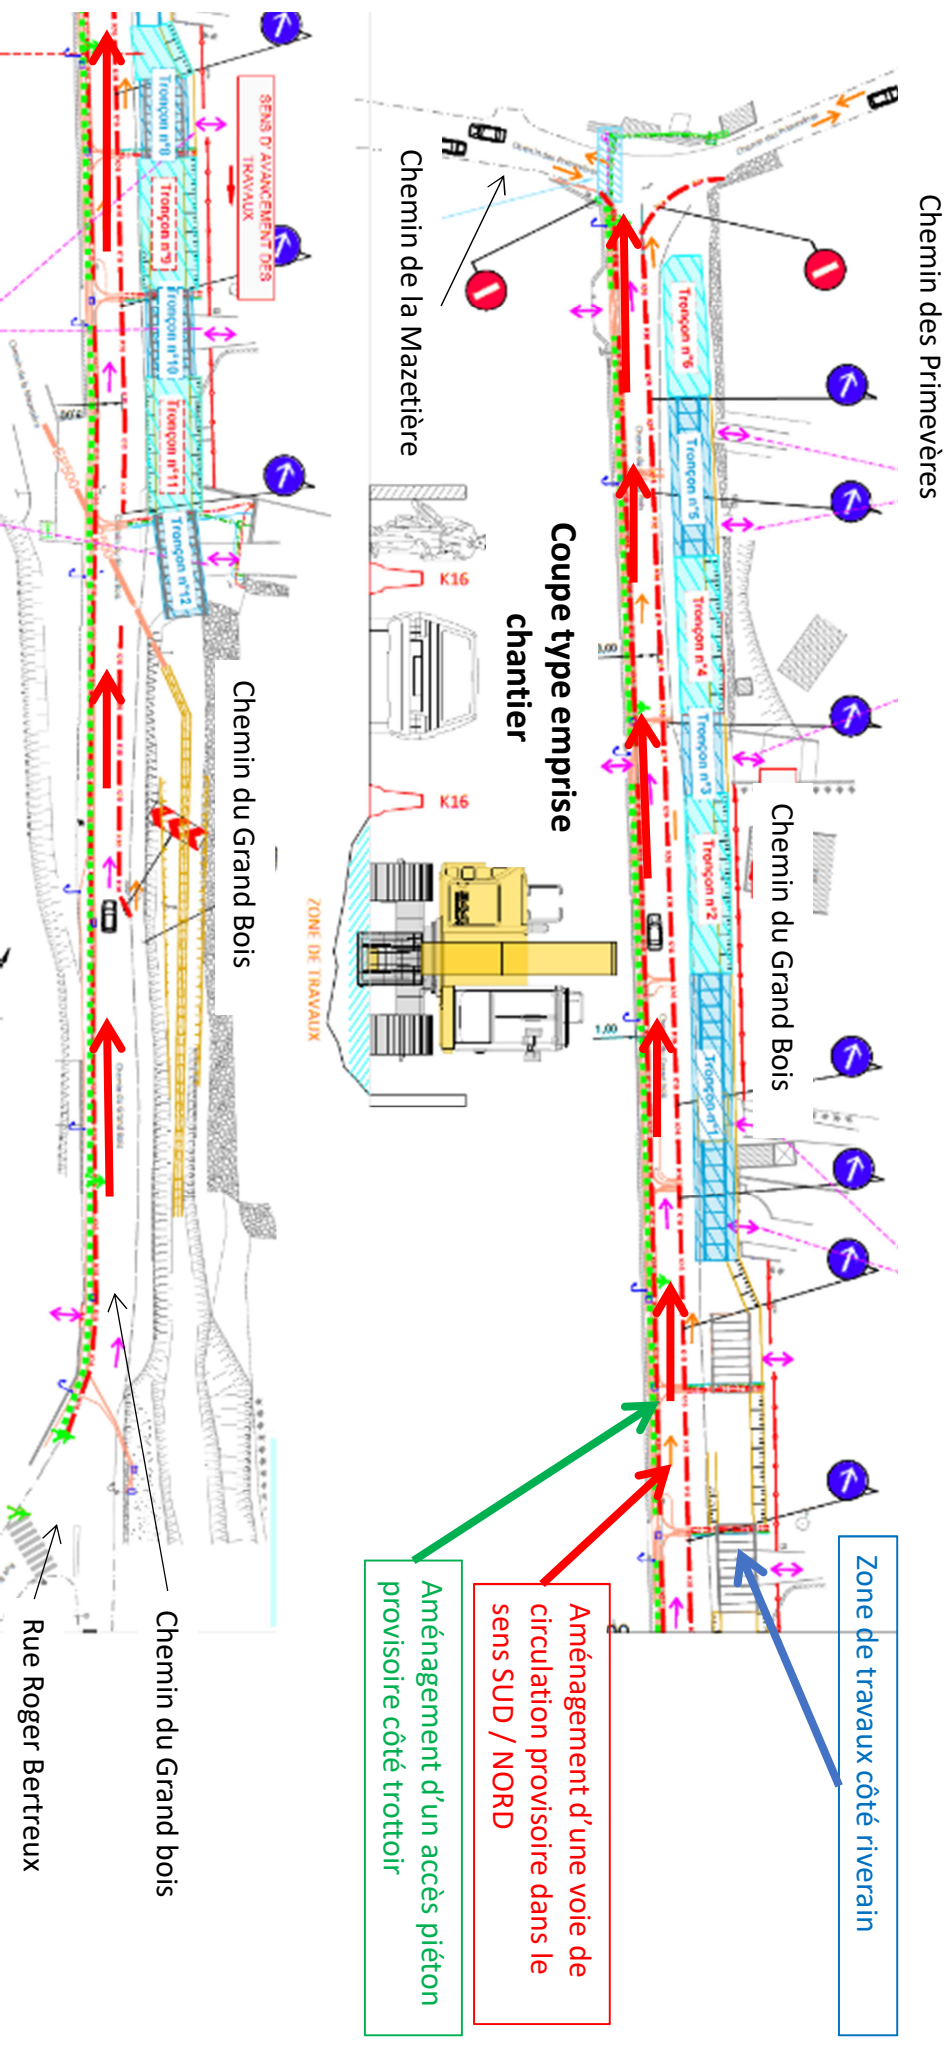

Pour rappel le sens unique de circulation reste inchangé: il en va de votre sécurité de le respecter

Plan gestion provisoire de la circulation du 26/04/2023 au 24/11/2023

